AANNEMERSBEDRIJF
J. BIJLEVELD BV
straat-grond-en rioleringswerk

PLANNING DE NOORD FASE 4

omschrijving	start	gereed
Na startoverleg met OG planning doorgeven aan Liander, Dunea, Ziut en parkeerbeheer.		**dec-18**
Voorbereiding		
Fase 4.1 Paul Krugerstraat	**14-jan**	**19-mrt**
opbreken verharding, aanbrengen riolering *1		
aanbrengen bestrating incl. plaatsen kolken		
Fase 4.2 Batavenstraat	**28-jan**	**1-mrt**
opbreken verharding, aanbrengen riolering		
aanbrengen bestrating incl. plaatsen kolken		
Fase 4.3 Cronjéstraat	**11-mrt**	**5-apr**
opbreken verharding, aanbrengen riolering		
aanbrengen bestrating incl. plaatsen kolken		
Fase 4.4 Chr. De Wetstraat	**1-apr**	**29-apr**
opbreken verharding, aanbrengen riolering		
aanbrengen bestrating incl. plaatsen kolken		
Fase 4.5 Taatstraat	**23-apr**	**17-mei**
opbreken verharding, aanbrengen riolering		
aanbrengen bestrating incl. plaatsen kolken		
Fase 4.6 Mr. D. Donker Curtiusstraat	**6-mei**	**12-jun**
opbreken en aanbrengen bestrating 4.6a		
opbreken en aanbrengen bestrating 4.6b		
aanbrengen beplanting		
buffer en afronding		
oplevering		**20-jun**
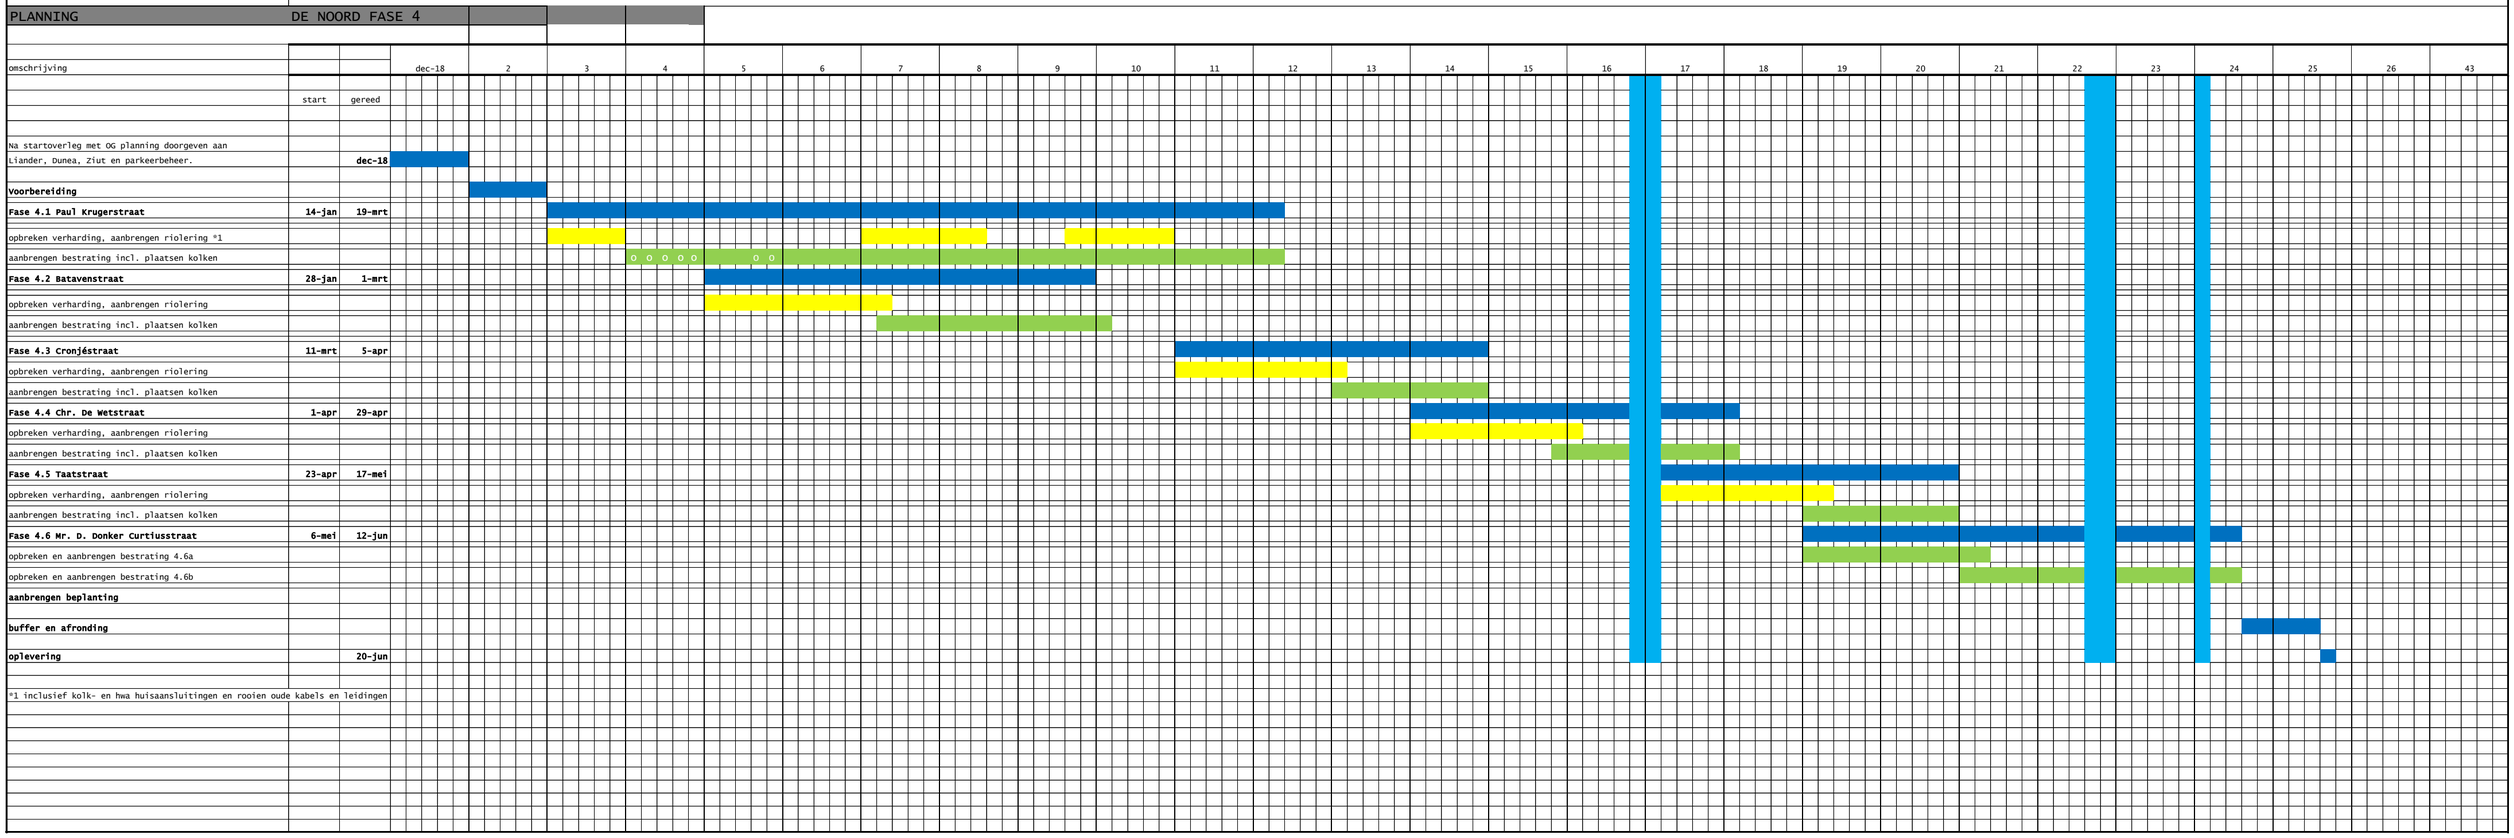
*1 inclusief kolk- en hwa huisaansluitingen en rooien oude kabels en leidingen
